


1 BESLUT OM NEDSKRIVNING

2019 genomfördes en förstudie inom NAV Etapp 1 som föreslog en ny försörjningsbyggnad strax öster om det nya sjukhuset. Efter närmare studier av kulvertstäckningar och en önskan att reservera plats för byggnader med större behov av närhet till de nya vårdbyggnaderna, beslutades istället en placering i sjukhusområdets norra del - där det nuvarande försörjningskvarteret ligger.

Projektet innebär att befintlig godsmottagning, som nu huserar i byggnad 28, skulle flyttas till en ny byggnad, öster om den befintliga avfallscentralen i byggnad 27. Godsmottagningens lastgård skulle delas med köket i byggnad 19. Avfallscentralen i byggnad 27 skulle ligga kvar men byggas om. En programhandling togs fram för ovanstående verksamhetsanpassning och tillbyggnad. Arean för verksamhetsanpassningar var knappt 2 200 kvm BTA och tillbyggnaden var drygt 4 400 kvm BTA. programkalkylen från år 2020 visade på en investering om 145 mnkr.

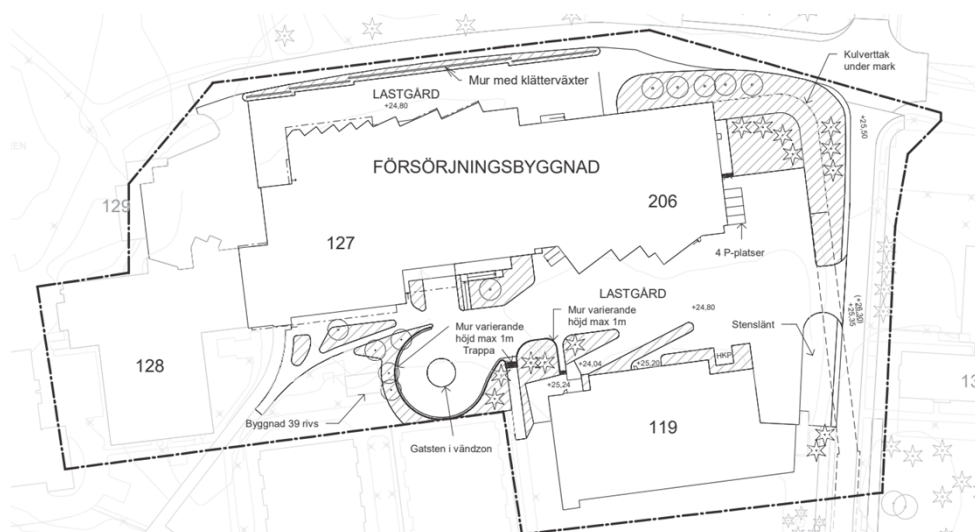

Med anledning av den höga kostnaden gav styrgruppen för Nytt Akutsjukhus i Västerås i uppdrag till programmet att utreda behovet av en så omfattande tillbyggnad och verksamhetsanpassning av försörjningsbyggnaderna. Förutsättningar för utredningen var att:

- Antalet vårdplatser inom sjukhusområdet inte skulle utökas.
- Den nya kulverten skulle ansluta till befintliga försörjningsbyggnader.
- Skapa skyddsrum för 240 personer.
- Investeringsutgiften inte fick överstiga 100 mnkr + reserv.

Behovsbeskrivning, förstudie och programhandling visar på att verksamhetsanpassningar kan göras av byggnad 27 och 28 som möjliggör flöden till och från ny kulvert tillsammans med en mindre tillbyggnad med ny entré, trapphus, hiss samt skyddsrum. Arean för verksamhetsanpassningar är

AKUTSJUKHUSET VÄSTERÅS ETAPP 1

Datum 2025-10-21
RV231060

knappt 3 900 kvm BTA och tillbyggnaden på ca 550 kvm BTA. Programhandlingskalkylen hamnar på en investering om 100 mnkr.

Upparbetade kostnader som avser den del av projekteringen som inte kan användas pga att uppdraget har förändrats väsentligt ska skrivas ner.

Beslutet innebär att delar av de projekteringskostnader som har bokförts i Program Nytt Akutsjukhus Västerås kopplat till försörjningsbyggnaden ska skrivas ner och utrangeras. Projektet har gjort bedömningen att nedskrivningen uppgår till 7 mnkr. Nedskrivningen och utrangeringen görs i december 2025 och kostnaderna bokförs på Program Nytt Akutsjukhus.

Beslut:

Att skriva ner och utränga pågående arbete om 7 mnkr som avser del av projektering av försörjningsbyggnaden.
